



OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL

MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 20 DE <u>DICIEMBRE</u> DEL 2023, REUNIDOS EN <u>COL. DEL VALLE</u> LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <u>AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL</u>

ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

FECHA:20 DE DICIEMBRE DEL 2023

H.AYUNTAMIENTO 2021-2024

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL

SUBREGION:

<u>010</u>

PROGRAMA:

ELECTRIFICACION

NOMBRE DEL PROYECTO:

ELE-ELECTRIFICACION

LOCALIDAD:

COL. DEL VALLE

MUNICIPIO:

FRESNILLO

MODALIDAD DE EJECUCION:

ADJUDICACION DIRECTA

No. DE CONTRATO:

MF DS AD FIII 19-23

FECHA DE INICIO:

23 DE JUNIO DEL 2023

FECHA DE TERMINACION:

19 DE NOVIEMBRE DEL 2023

EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:


CONSTRUCTORA: ING. ERIQUE REYES DAVILA.

(ICDEL S.A. DE C.V.)

REPRESENTANTE: ING. ENRIQUE REYES DAVILA.

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE LA OBRA:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL.







Antonia vila Pini

RJ1





OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL

BENEFICIARIOS: 80 BENEFICIARIOS

INVERSION AUTORIZADA:

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL (\$)	FEDERAL(\$)	ESTATAL(\$)	MUNICIPAL(\$)	PARTICIPANTES (\$)
		\$399,064.66	\$0.00	\$0.00	\$399,064.66	\$0.00

INVERSION EJERCIDA:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL(\$)	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
2023	398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$0.00
TOTAL	\$398,869.67	\$0.00	\$0.00	\$398,869.67	\$0.00

MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)

NPO:

MONTOS: \$

RELACION DE ESTIMACIONES:

ANTICIPO	\$ 119,660.90	
ESTIMACIÓN ESTIMACION 1	\$ 215,716.99	
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	\$ 63,491.78	
	\$	
TOTAL	\$ 398,869.67	

ECONOMIA\$

H AVINTAMIENTO

FRESNILLO
Tiene Rumbo

Antoniouribe Pins

Tiene Russ

2

Hoz B

4 laria





OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE FIANZA DE ANTICIPO No.457-19691-1 POR LA CANTIDAD DE \$119,660.90 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 457-19691-0 POR LA CANTIDAD DE \$39,886.96 Y VICIOS OCULTOS 457-19795-5 POR LA CANTIDAD DE \$39,886.96 VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA:

"Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA."

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 145, 146, 149, 150, Y 153 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES.

Dirección Desarrollo

ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA **DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL** Y EL COMITÉ DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD.





Antony unbe Rim





OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL

ENTREGA:

DRA. RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

C. JUAN PÉREZ GUARDADO DIR. DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SUCIAL

YVIGILANCIA

Dirección de

LAE. EDUARDO CHAIREZ JAIME VOCAL DE CONTROL Y VIG. COPLAMUN

CONTRATISTA DE OBRA

ING. ENRIQUE REYES DAVILA

(ICDELS.A. DE C.V.)

INSTANCIA REVISORA

ING. ARTURO TORRES LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECIBE

POR LA AUTORIDAD LOCAL PUESTO, NOMBRE Y FIRMA


POR EL COMITÉ DE OBRA PUESTO, NOMBRE Y FIRMA







2,148





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PEREZ
GUARDADO
JUAN
DOMICILIO
C HUICHOLES 204 A
COL BÜENOS AIRES 98056

ZACATECAS, ZAC.

CLAVE DE ELECTOR PRGRJN68090832H501

CURP PEGJ680908HZSRRN01 ANO DE REGISTRO 2002 03
ESTADO 32 MUNICIPIO 056 SECCIÓN 1821


LOCALIDAD 0001 EMISION 2018 WIGENCIA 2028

98/09/1968











IDMEX1795067177<<1821022799333 6809087H2812313MEX<03<<13567<3 PEREZ<GUARDADO<<JUAN<<<<<<






IDMEX2451870168<<0136006385617 8002170H3312315MEX<02<<05345<7 TORRES<LUNA<<ARTURO<<<<<<<<
















NSTITUTO FEDERAL ELECTORAL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES CREDENCIAL PARA VOTAR



EDAD

SEXO


DOMICILIO

C GUANAJUATÓ 228 FRESNILO 99000 FRESNILLO , ZAC. FOUR 0000054210462 ANO DE RECLAVE DE ELECTOR URPIAN730612

CURP UIPA730612MZSRXN02

VIGENCIA HASTA 2023 seccion 0179 MUNICIPIO 010 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2013



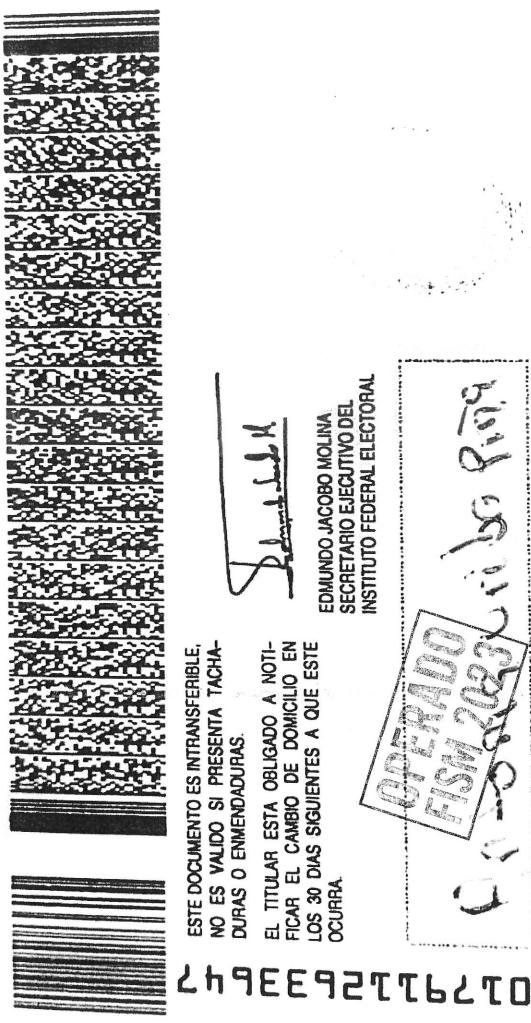

NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-DURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORA EDMUNDO JACOBO MOLINA SECRETARIO EJECUTIVO DEI

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

FLECCIONES FEDERALES
